

都市再生整備計画 事後評価シート

小野東ひまわりの丘公園周辺地区

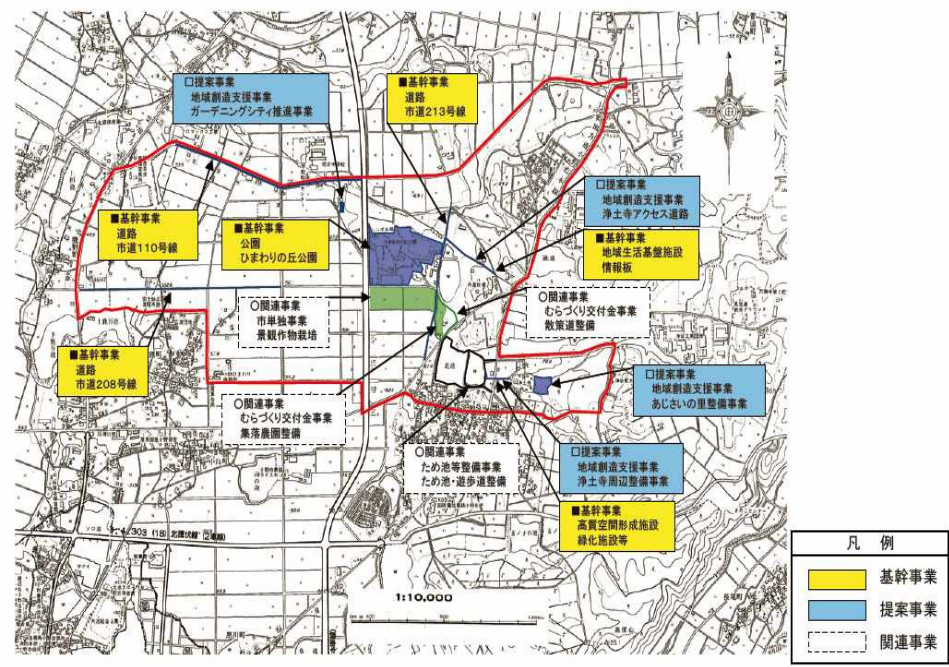
平成23年2月

兵庫県小野市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名		兵庫県		市町村名		小野市		地区名		小野東ひまわりの丘公園周辺地区			面積		248ha		
交付期間		平成18年度～22年度		事後評価実施時期		平成22年度		交付対象事業費		393		国費率		0.4			
20102926																	
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	事業名															
		基幹事業	道路(市道213号線、市道208号線)、地域生活基盤施設(観光案内板)、高質空間形成施設(市境等景観整備)														
		提案事業	地域創造支援事業(ガーデニングシティ推進事業、あじさいの里整備事業、ひまわりの丘公園～浄土寺アクセス道路整備事業)														
	当初計画から削除した事業	事業名							削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
		基幹事業	高質空間形成施設(市境等景観整備)							緑化施設等の設置箇所の見直しによる				影響なし。			
	新たに追加した事業	提案事業	なし							—				—			
		基幹事業	道路(市道110号線)、公園(ひまわりの丘公園)、高質空間形成施設(浄土寺周辺整備)							安全性、利便性の向上のため、道路・公園等の整備を追加。				目標、指標に関係するが、数値目標は据え置く。			
	交付期間の変更	提案事業	地域創造支援事業(浄土寺周辺整備事業)							観光拠点浄土寺の利便性を高めるため				目標、指標に関係するが、数値目標は据え置く。			
当初		平成18年度～平成21年度			交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		目標、指標に関係するが、数値目標は据え置く。										
変更	平成18年度～平成22年度																
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標			従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期				
			単位	基準年度	目標年度	モニタリング	評価値										
	指標1	ひまわりの丘公園利用者数	人	800,000	H16	900,000	H22		998,000	○	あり なし	公園整備及び周辺道路等の整備により、アクセスが向上し、観光スポットとの回遊性が高まり、利用者が増加した。	平成23年5月				
	指標2	あじさいの里ボランティア会員数	人	0	H16	30	H22		32	○	あり なし	浄土寺裏山にあじさいの植樹計画から参画した、地元住民のボランティア組織により管理することができている。	平成23年4月				
	指標3	育苗苗数	ポット	30,000	H16	90,000	H22		148,000	○	あり なし	育苗数が大幅に増加して、さまざまな公共施設へ花を提供し、植栽活動を実施することができた。	平成23年4月				
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指 標			従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期				
			単位	基準年度	目標年度	モニタリング	評価値										
	その他の数値指標1																
	その他の数値指標2																
	その他の数値指標3																
4)定性的な効果発現状況	地域のことは地域で考えて実施していこうと、小野地区の地域づくり協議会の活動が活発化するとともに、ガーデニングボランティアの活動の場が広がっている。																
5)実施過程の評価	実施内容					実施状況					今後の対応方針等						
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった										
	住民参加プロセス	地域づくり協議会の活動					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった					● 小野地区地域づくり協議会が中心となり、住民によるまちづくりを進めていく。					
	持続的なまちづくり体制の構築	①地域づくり協議会の活動充実 ②あじさいの里管理ボランティアの組成 ③ガーデニングボランティアの活動充実					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった					● ①あじさいの里ボランティアを定着して、住民による活動を展開する。 ②小野地区地域づくり協議会の活動を引き続き支援する。 ③ガーデニングボランティアの活動を活性化し、自立した組織をめざす。					

様式2ー2 地区の概要

小野東ひまわりの丘公園周辺地区（兵庫県小野市） 都市再生整備計画事業の成果概要						
まちづくりの目標		目標を定量化する指標		従前値		目標値
交通環境改善と景観整備による観光資源を生かした地域の活性化		ひまわりの丘公園利用者数	単位：人	800,000	H16	900,000 H22
		あじさいの里ボランティア会員数	単位：人	0	H16	30 H22
		育苗苗数	単位：ポット	30,000	H16	90,000 H22
		歩行環境の満足度	単位：%	10	H16	60 H22
 市道213号線  牧場南側の散策道  Map showing project locations: Shido 213, Shido 110, Shido 208, and various park and garden projects. Legend: Yellow = Basic Project, Blue = Proposal Project, Dashed = Related Project.  あじさいの里  ひまわりの丘公園						
まちの課題の変化	・ひまわりの丘公園から浄土寺へのアクセス道路の整備、ひまわりの丘公園の周辺道路の歩道新設等を実施したことにより、歩行者等の安全性・利便性が向上した。 ・ガーデニングボランティアが育てた花を活用して、統一感のある植栽を行っていることにより、観光地としての一体感が整備された。 ・ひまわりの丘公園の近くにガーデニングボランティアの活動拠点施設を整備して、育苗活動の拠点とすることができた。 ・観光資源の周辺整備をまちづくり交付金等を活用して実施したことにより、観光スポットの回遊性ができた。					
今後のまちづくりの方策（改善策を含む）	ひまわりの丘公園や浄土寺などの公園、歴史的文化遺産など当市の観光資源が集積している地域であるため、引き続き都市基盤整備を推進して、市民や観光客の利便性・快適性の向上をはかる。地域づくり協議会を中心に、ボランティアグループ等の住民参画のまちづくりを継続して、地域の活性化を図るため、都市基盤施設の整備を推進するとともに観光促進事業を充実する。					
